




जिरी नगरपालिका जिरी, दोलखा

आ व २०७८/०७९ मा संचालित योजना /
कार्यक्रमको प्रगति विवरण

२०७९ भाद्र ५ गते

जिरीको संक्षिप्त परियच

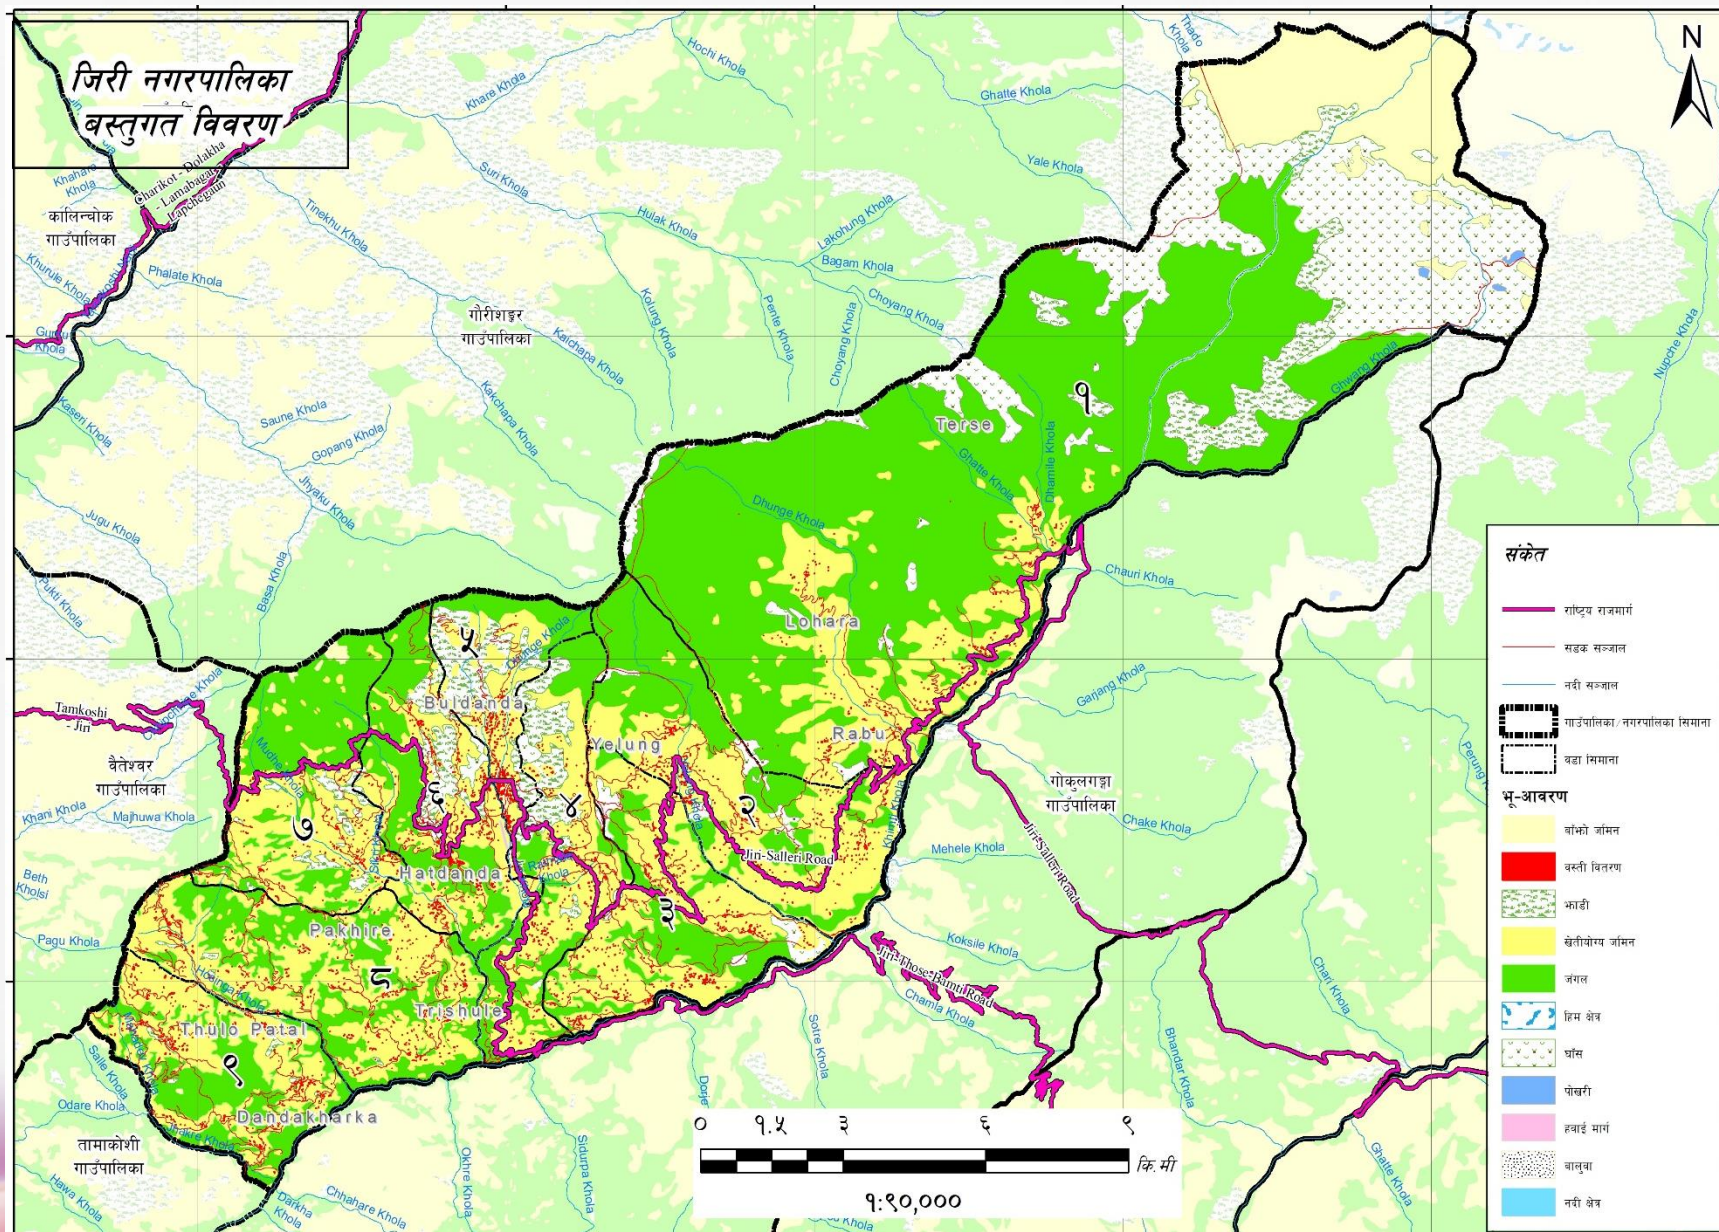

२०७३ सालमा साविकका उल्लेखित गाविसहरू मिलेर बनेको
नगरपालिका

वडा नं.	साविकका गा.वि.स.	साविकका वडा
१	श्यामा	१-६
२	श्यामा	७-९
	जिरी	१
३	जिरी	२,३
४	जिरी	४
५	जिरी	५
६	जिरी	६
७	जिरी	७
८	जिरी	८,९
९	जिरी	१०,११

- नेपालको स्वीजरल्याण्डको रूपमा समेत परिचित ।
- क्षेत्रफल: २११.२५ वर्ष किलोमिटर
- जनसंख्या २०६८ को जनगणना अनुसार १५५१५ जना ।
- भौगोलिक अवस्थिति
 - ❖ २७°३३'४८" देखि २७°४६'२६" उत्तरी अक्षांससम्म र ८६°११'१९" देखि ८६°२५'५०" पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित
 - ❖ समुद्र सतहबाट १६४९ देखि ५३४१ मिटर सम्मको उचाई
 - ❖ सिमाना: पूर्वमा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका, पश्चिममा दोलखा जिल्लाको बैत्येश्वर र गौरिशंकर गाउँपालिका तथा उत्तर र दक्षिणमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका र रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका

प्रमुख स्थानहरू

- चेर्दुङ पर्यटकीय स्थल
- लिंकन बजार
- जिरेश्वर महादेव मन्दिर
- राम्बोले कालिदेवी मन्दिर
- पाँच पोखरी, जटा पोखरी
- स्टोन पार्क
- गुँरास पार्क
- तेन्जिङ हिलारी मेरोरियल पार्क
- टोनि हेगन इकोलोजिकल पार्क

लिनकन बजार



जिरी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन



विनियोजित बजेट र प्रगति

कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति		वित्तीय प्रगति प्रतिशत
	विनियोजन	खर्च	
चालू तर्फ	३४,४४,३१,०००	२८,२५,००,१६७	८२.०१%
पूँजीगत तर्फ	२७,४९,०९,५४०	१९,७५,८०,२२८	७१.८७%
कुल जम्मा	६१९३४०५४०	४८,००,८०,३९५	७७.५१%

बिषयगत योजनाको बजेट र प्रगति

वडाको विवरण	बिनियोजन रकम	खर्च	प्रगति प्रतिशत	
			भौतिक	वित्तीय
आर्थिक विकास	४,३६,५६,६२२	२८७३६२७६		६५.८%
सामाजिक बिकास	२६,१३,४४,०००	२१,०६,८४,३८३		८०.६१%
पूर्वाधार बिकास	२१,२६,२७,९१८	१६,०२,९७,८८४		७५.३८%
वन वातावरण तथा विपद ब्यबस्थापन	१,२३,१३,०००	६४,६५,५४२		५२.५%
सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र	१,३८,७१,०००	९२७३९५५.९८		६६.८५%

प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम तर्फ

सि. नं.	योजना संख्या	विनियोजित बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	१८	१६७३७५००	१५९९८२८१	९५.५९%	१००%

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

सि. नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
१	युव रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल आयोजना	४४०००००	४३८५२००	९९.६६%	१००%
२	कामको लागि पारिश्रमिक	२३९५०००	२३६५९३२	९८.७९%	१००%

आ.व २०७८/७९ को ठेक्का तर्फ

सि.नं.	योजनाको नाम	स्रोत	सम्झौता रकम (कर सहित)	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
१.	जिरी माली श्याम सडक	संघ समपुरक	२,४८,०४,४४१।०१	१००%	१००%
२.	जिरी फुल्पिङ्ग झाँक्रे सडक (क्रमागत)	प्रदेश समपुरक	१,४०,९०,९६१।०४	१००%	८०%
३.	जिरी बसपार्क स्तारोन्नती	प्रदेश सशर्त	२४,४४,५२८।००	१००%	१००%
४.	ल्याण्डफिल साइट	संघ विशेष	२१,१४,७२३।३८	१००%	१००%
५.	बसपार्क स्तारोन्नती (०+०४१- ०+०५७)	प्रदेश सशर्त	२४,८४,७७४।०८	१००%	१००%
६.	सिमखर्क मेहेले झो.पु	संघ सशर्त	२६,५४,०९८।११	१००%	१००%
७.	घट्टेखोला झो.पु	संघ सशर्त	८,३९,६३९।३८	१००%	१००%

सि.नं.	योजनाको नाम	स्रोत	सम्झौता रकम (कर सहित)	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
८.	लिसेटोल खानेपानी	प्रदेश विशेष	४३,८४,८३१।०४	१००%	७५%
९.	जिरी प्राविधिक शिक्षालयको प्रसाशनिक भवन निर्माण (क्रमागत)	संघ विशेष	३,३२,८६,२७९।१८	४०%	४०%
१०	जिरी सपिङ्ग कम्प्लेक्स	नगर विकास सफकोषको ऋण र जिरी नगरपालिका	६६६५३०७५।७९	७०%	७०%
११	चेर्दुङ्ग एकीकृत पर्यटन पुर्बधार विकास योजना	संघ र नगरपालिका को साझेदारी	२५९१६०७९।२०	१००%	३०%

समग्र भौतिक प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	परिमाण	इकाई
१	सडक ढलान	२००	मि.
२	सडक ग्राभल	६	कि.मि
३	नयाँ ट्रयाक	२	कि.मि
४	सडक सोलिड	१२	कि.मि
५	वडा कार्यालय भवन निर्माण-वडा नं.५,६ र ८	३	वटा
६	स्वास्थ्य केन्द्र	२	वटा
७	झो.पू	२	वटा
८	ल्याण्डफिल साइट	१	वटा
९	सपिङ्ग कम्प्लेक्स	१	वटा
१०	खानेपानी	२५०	घरधुरी

समस्या तथा चुनौतिहरु

१. समयमानै वजेट निकास नहुनु
२. आन्तरिक श्रोतको कमी
३. ठूलो र बिकट भौगोलिक अवस्थिति
४. वजेटको सिमितता
५. SUTRA Sytem मा गडबडी

प्रदेश तथा संघीय सरकारसंगको अपेक्षा

- जिरी अस्पतालको संचालन र ब्यबस्थापनमा सहयोग
- कोल्डस्टोर निर्माण कार्यसम्पन्न र संचालनको व्यवस्था
- Clean Jiri, Green Jiri, Organic को अभियानलाइ सफल पार्न आवश्यक सहयोग
- ब्यबसायिक कृषि र पर्यटन प्रबर्धनमा सहयोग
- जिरी नगरपालिकालाइ बिशेष क्षेत्र घोषणा गरि सोहि बमोजिमको कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था



धन्यवाद
